



GARTENSTADTHAAN

Katholische Grundschule Don Bosco Interimsbau

11. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung
und Bau der Stadt Haan

Anlage zum Sachstandsbericht zu den Projekten des
Gebäudemanagements

Projektrahmendaten

allgemein

Auf Grund der im Projekt aufgetretenen Verzögerungen, dient die vorliegende Planung der Sicherstellung des örtlichen Schulbetriebes

Projektdaten

- 65 m² großer Containerbau mit Vorraum
- geplante Mietdauer 2 Jahre


geplante Fertigstellung

- Montage in KW 30


Kosten

- Mietkosten für den Zeitraum von 2 Jahren 82.000,- €

Lageplan

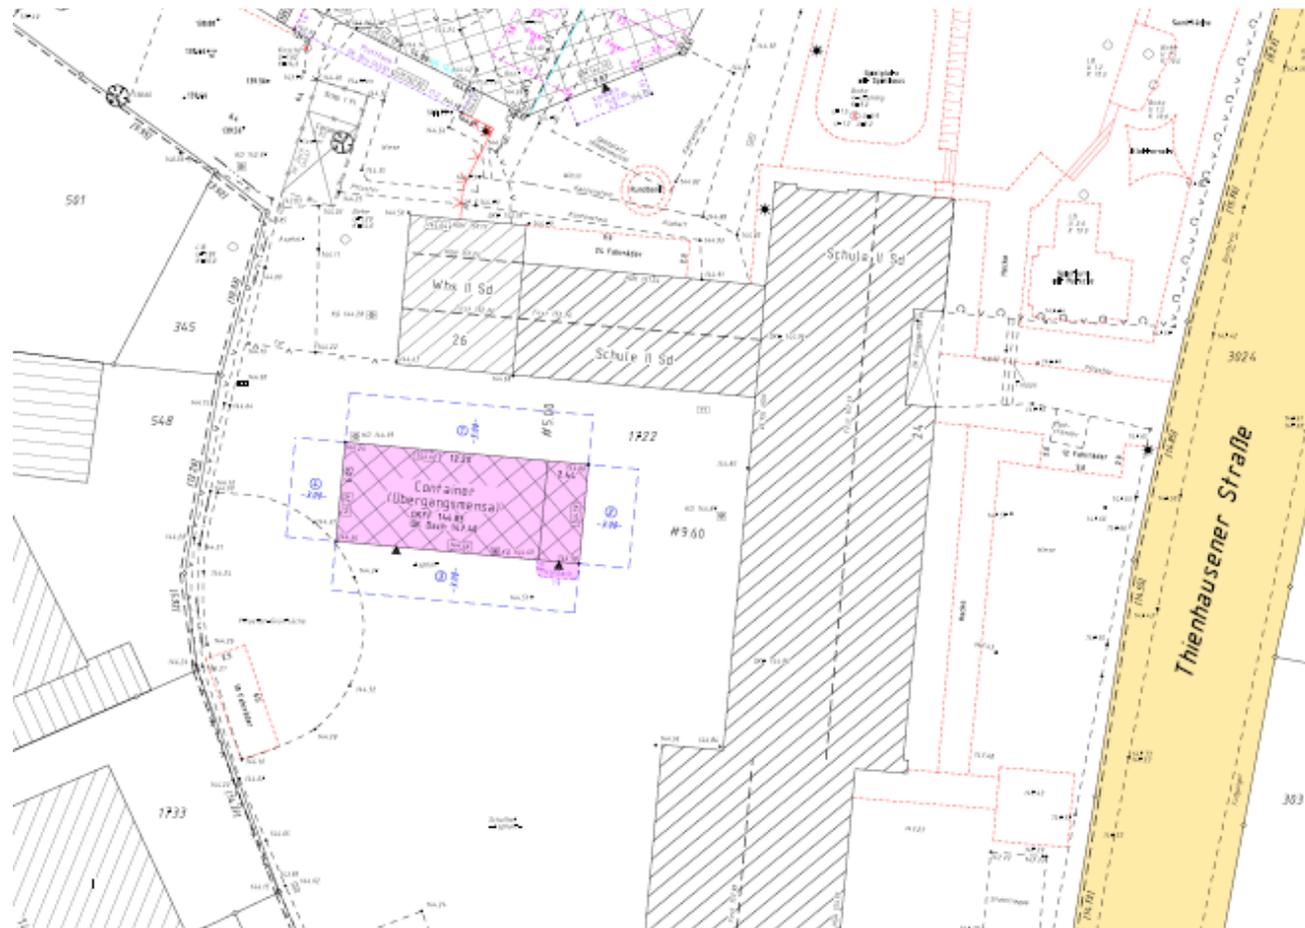

Grundriss

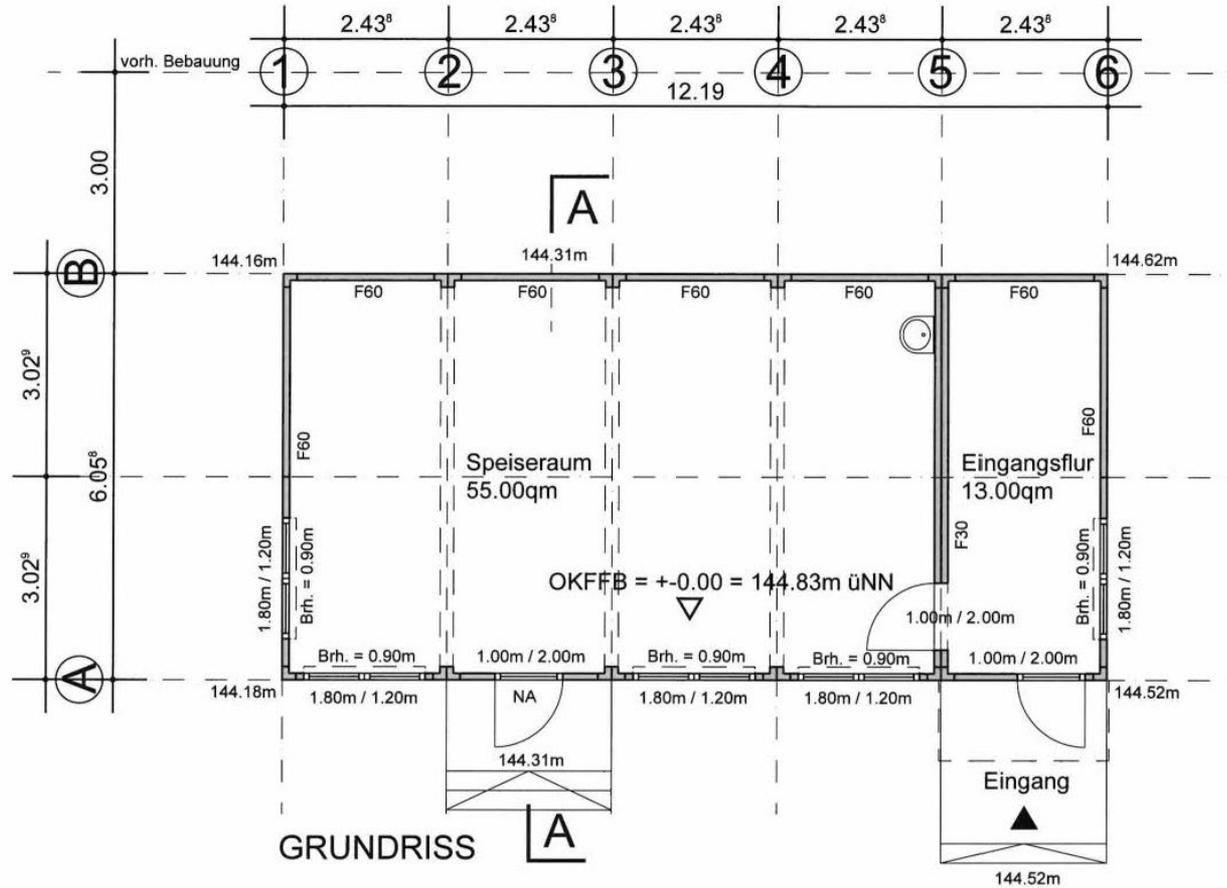

Ansichten

