



GARTENSTADTHAAN

Sachstandsbericht

Dezernat III
Betriebshof / Amt 70
Stand: 18.09.2025

Neubau Spielgerät Grundschule Bollenberg


Nach den Ausschüssen für Bildung und Sport (18.09.2024) und Jugendhilfeausschuss (25.09.2024) Vorlage 70/041/2024 wurde die Beschlussgrundlage für die Ausschreibung der Maßnahme geschaffen. Ziel der Maßnahme ist der Ersatz des alten, abgängigen Großspielgerätes über ein neues Großspielgerät mit Fallschutzfläche auf Grundlage des Beteiligungsprozesses A51. Die Maßnahme wird Anfang 2026 begonnen.

Sachstand:

- Planungsphasen Ausführungsplanung und Erstellung Leistungsverzeichnis sind abgeschlossen.
- Die Vergabe ist erfolgt.

Nächste Schritte:

- Das neue Spielgerät wird vorbehaltlich Lieferzeiten und witterungsbedingter Behinderungen inklusive neuem Fallschutzbelag ab Januar 2026 errichtet.

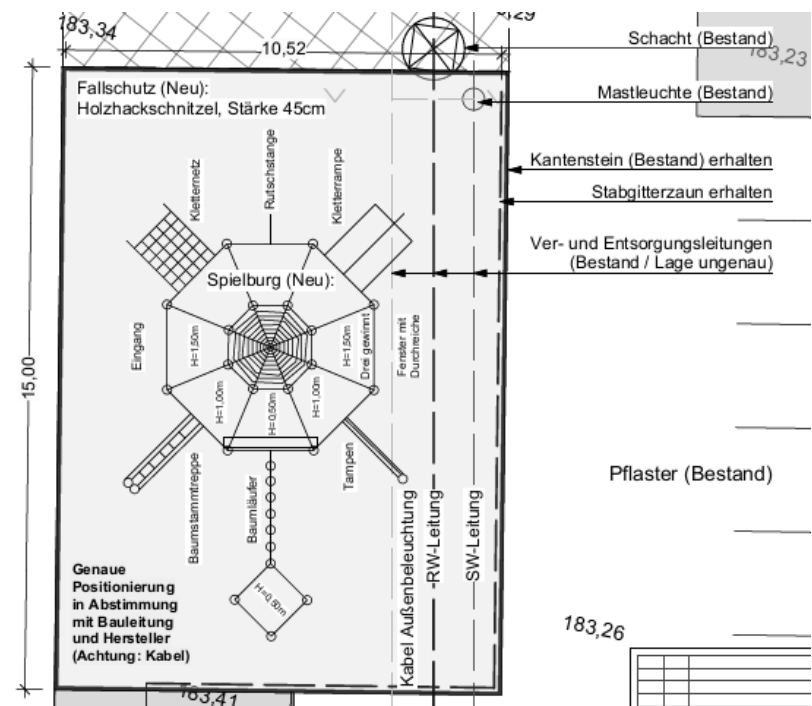

Neubau Ballfangzaun Cageballanlage Goerdelerstraße


Auf Grundlage der Fördermittelzusage für die Realisierung der Maßnahme wird der Bolzplatz Goerdelerstraße neu gestaltet. Ziel der Maßnahme ist die Errichtung einer Ballfangzaun Cageballanlage inklusive eines neuen Spielfeldbelages aus Asphalt und neuer Fußballtore mit Basketballkörben. Die Maßnahme wird im Jahr 2025 begonnen.

Sachstand:

- Planungsphasen Ausführungsplanung und Erstellung Leistungsverzeichnis sind abgeschlossen.
- Die Ausschreibung wurde initiiert.
- Ein Ausschreibungsergebnis liegt noch nicht vor.
- Die Maßnahme befindet sich im Durchführungszeitraum bis zum 31.12.2026.

Nächste Schritte:

- Nach Vergabe der Bau- und Lieferleistung wird die neue Bolzplatzanlage ab Ende 4. Quartal 2025 errichtet.

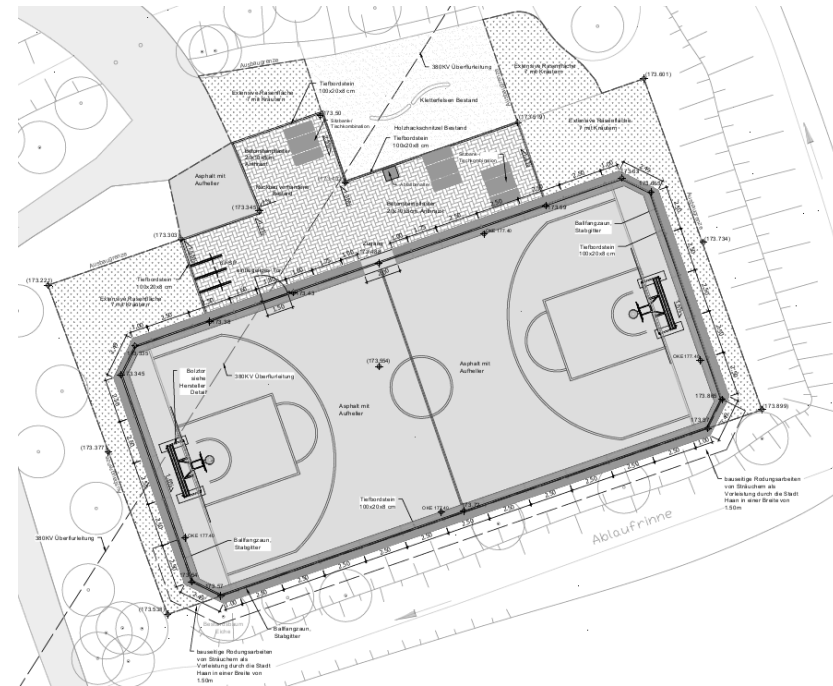

Neubau Ballfangzaun Cageballanlage Tenger


Über einen Spendenzusage des Lions-Clubs Haan für die Realisierung einer neuen Ballfangzaunanlage Cageball wird der Ballfangzaun am Bolzplatz Tenger neu gestaltet. Ziel der Maßnahme ist neben der Aufwertung der Anlage, die Erhöhung der Spiel Qualität und die Verringerung der Gefahr des Ballverlustes durch Schließung der Längsseite zur Straße. Die Maßnahme wird im Jahr 2025 abgeschlossen.

Sachstand:

- Planungsphasen Ausführungsplanung und Angebotseinholung sind abgeschlossen.
- Die Beauftragung ist erfolgt.
- Die Ausführung des Ballfangzaunes befindet sich in der Fertigstellung.

Nächste Schritte:

- Zwei neue Fußballtore mit Basketballkörben und eine Spielfeldmarkierung wird im 4. Quartal 2025 eingebracht.

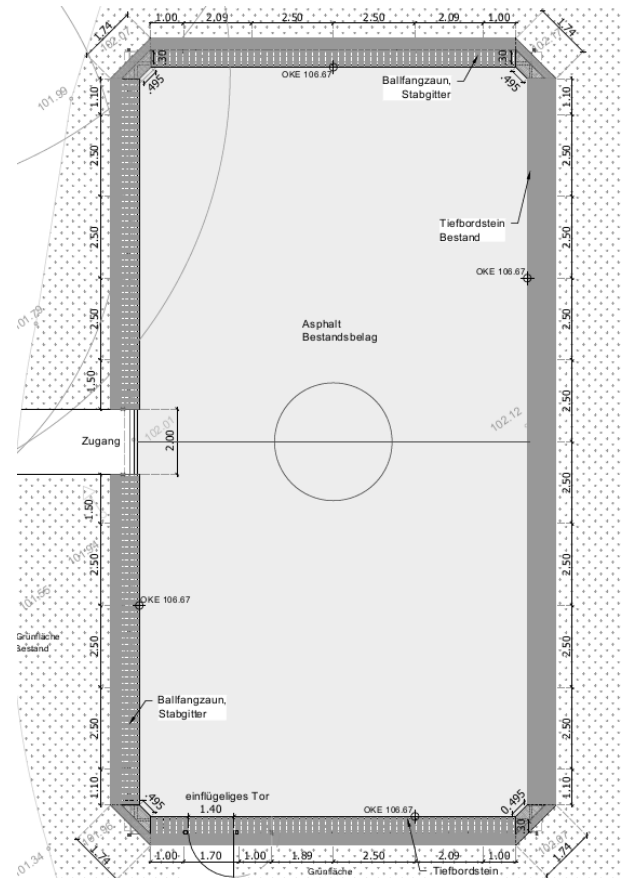

Neubau Motorikpfad Grundschule Mittelhaan


Nach den Ausschüssen für Bildung und Sport (18.09.2024) und Jugendhilfeausschuss (25.09.2024) Vorlage 70/041/2024 wurde die Beschlussgrundlage für die Ausschreibung der Maßnahme geschaffen. Ziel der Maßnahme ist der Ersatz der alten, abgängigen Reckstange und des abgängigen Spielgerätes im Bestand über ein neues Motorikspielgerät mit neuer Gummifallschutzfläche. Die Maßnahme wird im Jahr 2026 begonnen.

Sachstand:

- Planungsphasen Ausführungsplanung und Erstellung Leistungsverzeichnis sind abgeschlossen.
- Die Ausschreibung wird im 4. Quartal 2025 initiiert.

Nächste Schritte:

- Nach Vergabe der Bau- und Lieferleistung wird das neue Spielgerät inklusive neuer Fallschutz errichtet.
- Zur Ausführung kommt die Maßnahme vorbehaltlich Lieferzeiten und witterungsbedingter Einschränkungen im 1. / 2. Quartal 2026.

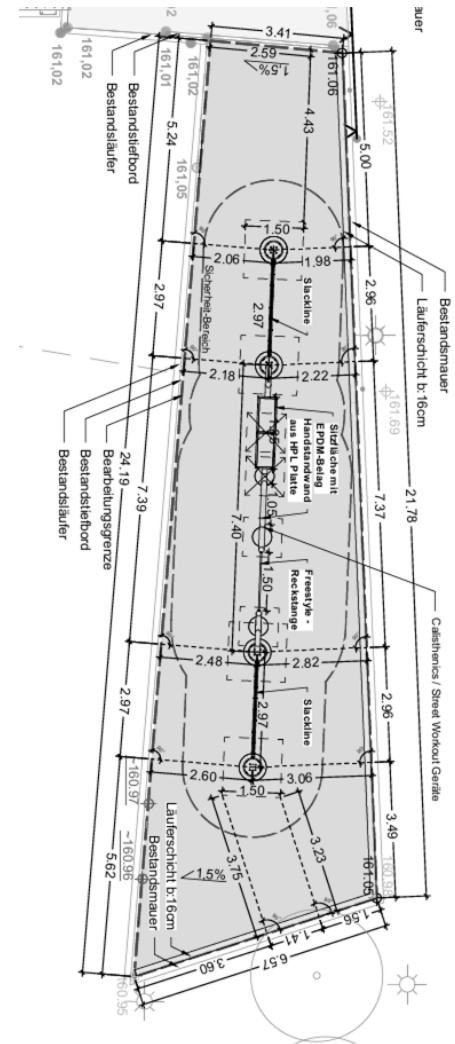


Kleinkinderspielgerät KITA Am Bollenberg

Nach den Ausschüssen für Bildung und Sport (18.09.2024) und Jugendhilfeausschuss (25.09.2024) Vorlage 70/041/2024 wurde die Beschlussgrundlage für die Ausschreibung der Maßnahme geschaffen.

Ziel der Maßnahme war die Errichtung eines Kleinkinderspielgerätes an der KITA Am Bollenberg.

Sachstand:

- Aufgrund des Entfalls der Kleinkindergruppe an der KITA Am Bollenberg wird die Maßnahme nicht realisiert und die eingeplanten Haushaltsmittel werden nicht verausgabt.

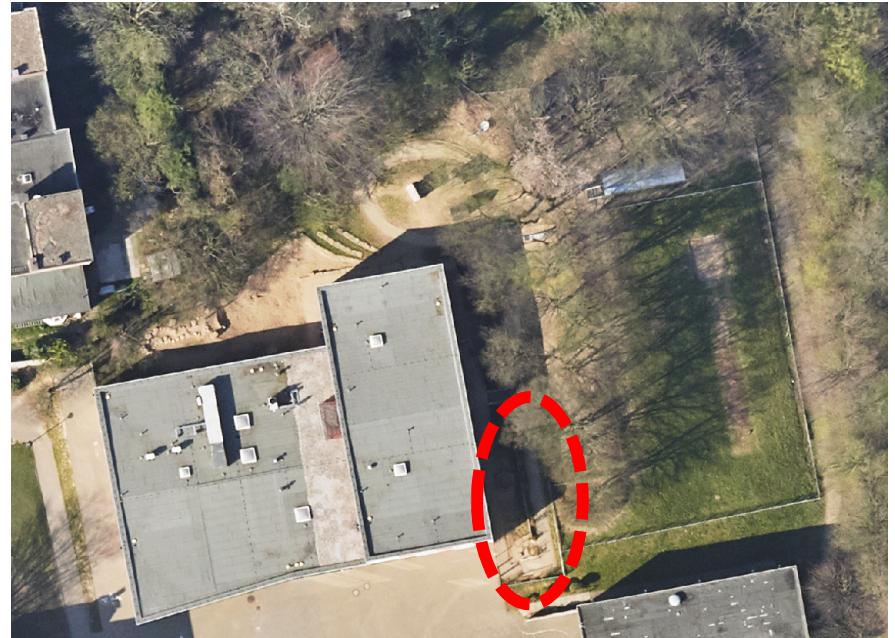

Spielplatz Tenger

Im Rahmen der von der Verwaltung vorgelegten Maßnahmenplanung für öffentliche Spiel- und Bolzplätze 2025 ff. werden Ersatzbeschaffungen für abgängige Ausstattungselemente und Spielgeräte erst nach Abschluss der Evaluierung des Spielflächenleitplanes und der politischen Beratung der Ergebnisse durchgeführt.

Sachstand:

- Im Rahmen von Instandhaltungsmaßnahmen über Ressourcen des Betriebshofes wurden am Spielplatz Tenger eine Doppelschaukel saniert, eine Tischtennisplatte gereinigt und eine Bank / Tischkombination wieder hergerichtet.
- Nach Lieferung von Einbauteilen werden 2 Stahlgitterbänke in der 2. Jahreshälfte 2025 montiert.

Nächste Schritte:

- Ab September 2025 wird die neue Ballfangzaunanlagen (Cageball) dank einer Spende errichtet.
- Auf Basis der Erkenntnisse der Evaluierung vorzuschlagende Maßnahmenplanung 2027 ff. werden Themen für den KSP Tenger beraten.

