Erweiterung und Modernisierung Stadtbücherei Haan
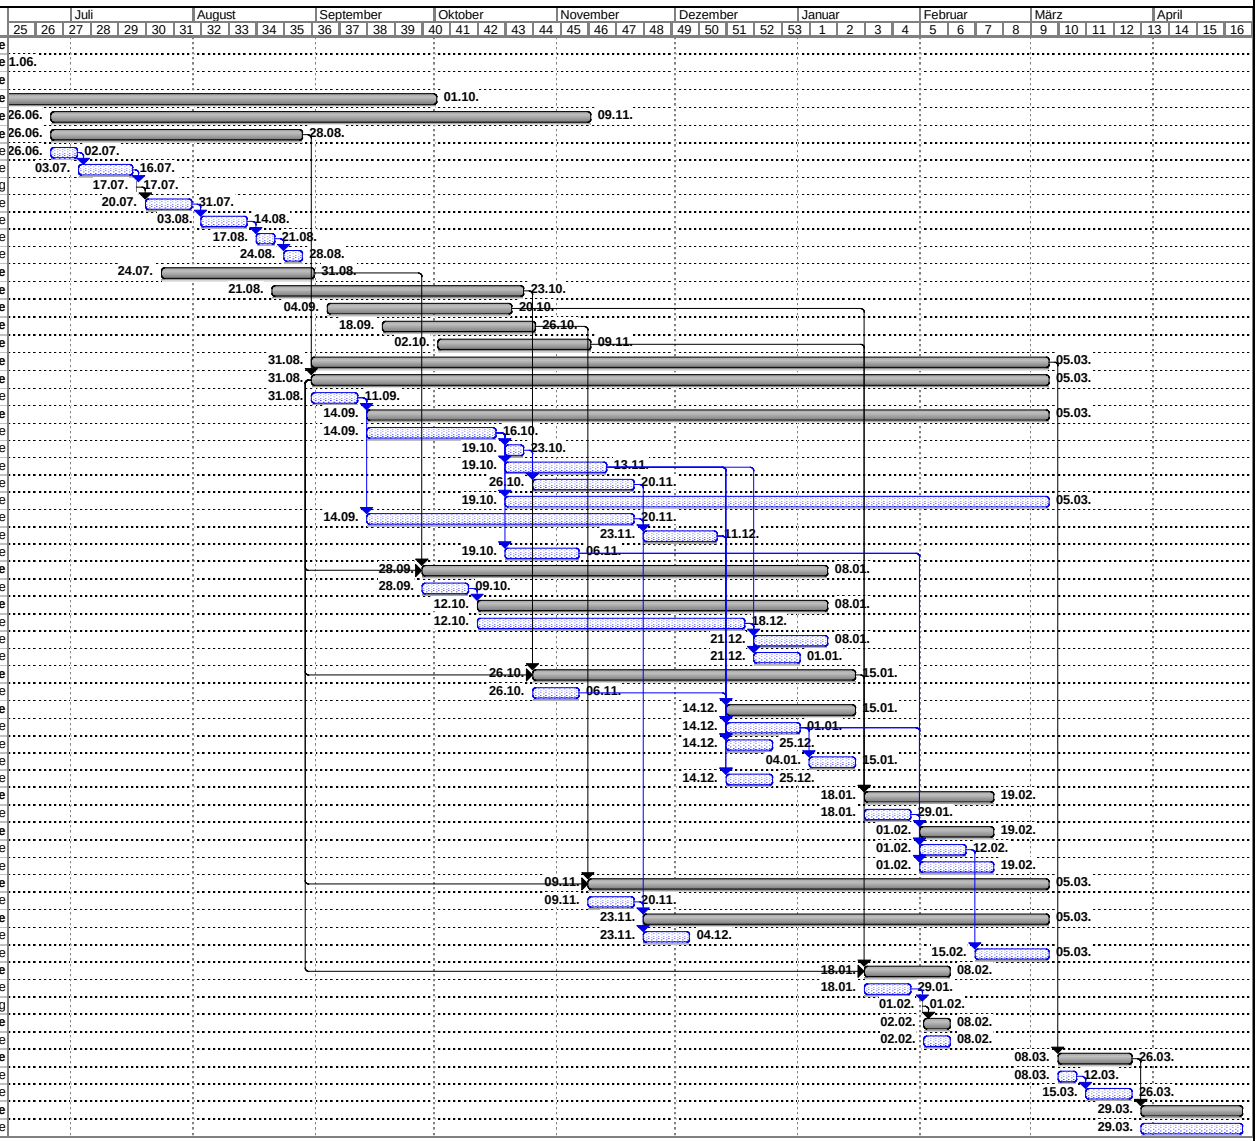
Nr.	Vorgangsname	Dauer
1	**Grundlagenermittlung bis Entwufsplanung**	**48 Tage**
7	**Genehmigungsplanung**	**90 Tage**
17	**Ausführungsplanung**	**40 Tage**
21	**Vorbereitung der Vergabe**	**106 Tage**
46	**Mitwirkung bei der Vergabe**	**97 Tage**
47	**Vergabeeinheit 01 (Abbruch/Schadstoff, Rohbau, Dach, Gerüst, HLSENT, Metallbau, Estrich)**	**46 Tage**
48	Vervielfältigung + Versand	5 Tage
49	Kalkulation	10 Tage
50	Submission	1 Tag
51	Preisspiegel und Vergabevorschlag	10 Tage
52	Aufklärung und/oder Verhandlung	10 Tage
53	Vergabevermerk	5 Tage
54	Beauftragung	5 Tage
55	**Vergabeeinheit 02 (Vorhangfassade, Aufzug)**	**27 Tage**
63	**Vergabeeinheit 03 (Trockenbau, Tischler, Türen, Betonwerkstein)**	**46 Tage**
71	**Vergabeeinheit 04 (Oberboden, Fliesen)**	**33 Tage**
79	**Vergabeeinheit 05 (Schlosser, Maler)**	**27 Tage**
87	**Vergabeeinheit 06 (GaLa)**	**27 Tage**
95	**Objektüberwachung**	**135 Tage**
96	**Vergabeeinheit 01 (Abbruch/Schadstoff, Rohbau, Dach, Gerüst, HLSENT, Metallbau, Estrich)**	**135 Tage**
97	Vorlauf	10 Tage
98	**Ausführung**	**125 Tage**
99	Abbruch/Schadstoff	25 Tage
100	Gerüst	5 Tage
101	Rohbau	20 Tage
102	Dach	20 Tage
103	HLSENT	100 Tage
104	Metallbau - Vorbereitung	50 Tage
105	Metallbau - Ausführung	15 Tage
106	Estrich	15 Tage
107	**Vergabeeinheit 02 (Vorhangfassade, Aufzug)**	**75 Tage**
108	Vorlauf	10 Tage
109	**Ausführung**	**65 Tage**
110	Werkplanung, Freigabe, Lieferzeit	50 Tage
111	Vorhangfassade	15 Tage
112	Aufzug	10 Tage
113	**Vergabeeinheit 03 (Trockenbau, Tischler, Türen, Betonwerkstein)**	**60 Tage**
114	Vorlauf	10 Tage
115	**Ausführung**	**25 Tage**
116	Trockenbau	15 Tage
117	Tischler	10 Tage
118	Türen	10 Tage
119	Betonwerkstein	10 Tage
120	**Vergabeeinheit 04 (Oberboden, Fliesen)**	**25 Tage**
121	Vorlauf	10 Tage
122	**Ausführung**	**15 Tage**
123	Oberboden	10 Tage
124	Fliesen	15 Tage
125	**Vergabeeinheit 05 (Schlosser, Maler)**	**85 Tage**
126	Vorlauf	10 Tage
127	**Ausführung**	**75 Tage**
128	Schlosser	10 Tage
129	Maler	15 Tage
130	**Vergabeeinheit 06 (GaLa)**	**16 Tage**
131	Vorlauf	10 Tage
132	Baubeginn	1 Tag
133	**Ausführung**	**5 Tage**
134	GaLa	5 Tage
135	**Abnahmen und Mängelbeseitigung**	**15 Tage**
136	Abnahmen	5 Tage
137	Mängelbeseitigung	10 Tage
138	**Wiederbezug**	**20 Tage**
139	Wiederbezug	20 Tage
